



みどモス

【西鹿田グリーンパーク】

公園づくり通信

第4回（発行：令和5年11月）

みどり市都市計画課
みどり市スポーツ振興課
群馬県桐生土木事務所


今回のお知らせ

- ・西鹿田グリーンパーク造成工事の状況
- ・第4回西鹿田グリーンパーク造成に関する連絡協議会を開催しました

西鹿田グリーンパーク造成工事の状況

西鹿田グリーンパーク予定地では、令和5年度から盛土工事を行っています。市道の北側で、工事現場から搬入した公共工事の建設発生土を仮置きし、市道の南側で盛土工事を行っています。令和5年度9月末時点の搬入土受入の進捗率は約55%で、そのうち盛土工事等の進捗率は約15%になっています。

今後は盛土工事の進捗にあわせて、建設発生土の搬入口を南側から北側に切り替え、市道の切り替え工事を行っていく予定です。

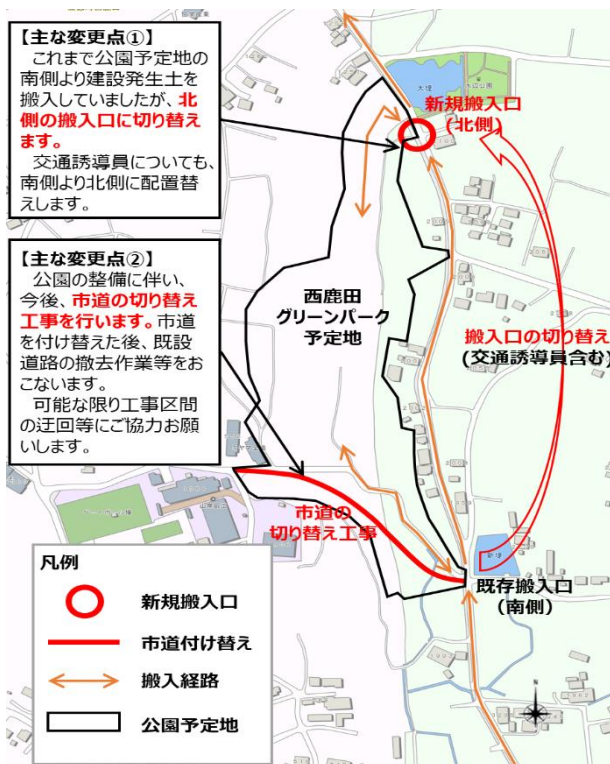

造成予定地



南側の盛土工事の様子

みどり市ホームページでも公園づくり通信を配信しています。
右のQRコードを読み取ってご覧ください。

QRコード



■本公園づくり通信に関するご意見やご質問は下記までお問い合わせください。

公園に関すること…みどり市スポーツ振興課スポーツ交流係

TEL:0277-46-9068 FAX:0277-72-0500

盛土造成に関すること…みどり市都市計画課まちづくり整備係

TEL:0277-76-1903 FAX:0277-76-1951

《裏面に続く》

第4回西鹿田グリーンパーク造成に関する連絡協議会を開催しました

第4回連絡協議会を令和5年10月30日(月)に開催しました。協議会では、前回からの動きや、現場の状況について説明しました。その後、実際に現場を視察し、現場の進捗状況や工事内容について確認しました。

第5回連絡協議会は、令和6年5月に開催する予定です。



上段：協議会の様子

下段：現場視察の様子

今 後 の 予 定

	西鹿田グリーンパーク整備		連絡協議会	公園づくり通信
令和4年度	基本計画 ・ 実施設計	盛土 造成 工事	★ 第1回 (R4.5.24) 済	★ 第1回 (R4.7) 済
			★ 第2回 (R4.10.6) 済	★ 特別号1 (R4.12) 済
令和5年度			★ 第3回 (R5.5.29) 済	★ 特別号2 (R5.4) 済
			★ 第4回 (R5.10.30) 済	★ 第3回 (R5.6) 済
				★ 第4回 (今回) 済
令和6年度		公園 施設 工事	★ 半年に1回を目安に開催する予定です。	★ 協議会開催後に発行します。
				★
令和7年度			★	★
			★	★

※事業の進行状況等により、スケジュールが変更となることがあります。
