



【西鹿田グリーンパーク】

# 公園づくり通信

第6回（発行：令和7年11月）

みどり市スポーツ振興課  
みどり市都市計画課  
群馬県桐生土木事務所

## 今回のお知らせ

- ・西鹿田グリーンパーク造成工事の状況
- ・第6回西鹿田グリーンパーク造成に関する連絡協議会を開催しました
- ・公園整備工事の工期を延長します

## 西鹿田グリーンパーク造成工事の状況

西鹿田グリーンパーク予定地では、サッカーグラウンド周辺の擁壁工事、調整池工事、用水路工事を行っています。令和7年9月末時点の進捗率は約23%になっています。


今後は観戦スタンドを含むサッカーグラウンド工事を中心に進めていく予定です。併せて公園整備工事の効率化を図るために、現場近くの西鹿田グラウンドに土砂の仮置き場を設け、今後の工事で使用する土砂を一時的に西鹿田グラウンドに仮置きします。土砂の運搬時には周囲の安全に配慮しながら実施いたしますので市民の皆様のご理解とご協力いただきますようお願い申し上げます。

### 【西鹿田グリーンパーク予定地～西鹿田グラウンド間の土砂運搬期間】

令和7年11月～令和8年8月(予定)



西鹿田グリーンパーク予定地

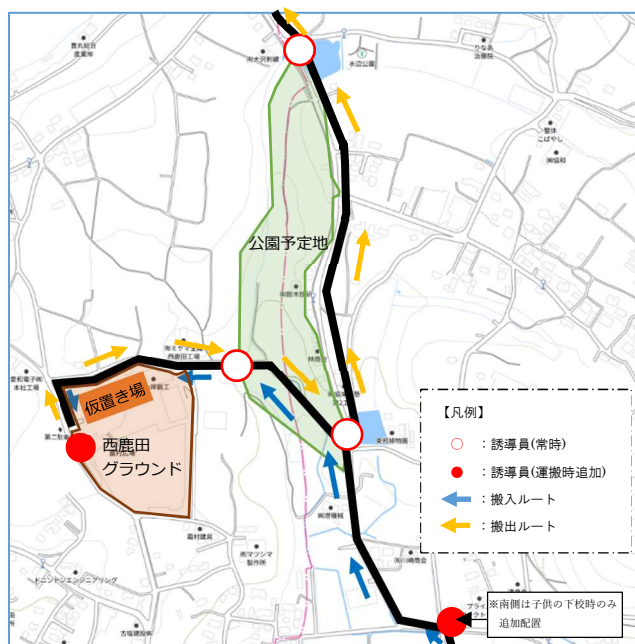

仮置き土砂の運搬ルート

みどり市ホームページでも公園づくり通信を配信しています。  
右のQRコードを読み取ってご覧ください。

QRコード



■本公園づくり通信に関するご意見やご質問は下記までお問い合わせください。

公園整備に関すること・・・みどり市スポーツ振興課施設管理係

TEL:0277-46-9068 FAX:0277-72-0500

連絡協議会に関すること・・・みどり市都市計画課まちづくり整備係

TEL:0277-76-1903 FAX:0277-76-1951

《裏面に続く》

## 第6回西鹿田グリーンパーク造成に関する連絡協議会を開催しました

第6回連絡協議会を令和7年10月31日(金)に開催しました。協議会では、前回からの動きや、現場の状況について説明しました。その後、実際に現場を視察し、現場の進捗状況や工事内容について確認しました。

### 公園整備工事の工期を延長しました

公園施設の調整池について、施工性の観点から再設計を行いました。再設計に伴い施工計画についても変更が生じたため、公園整備工事の工期を延長しました。

公園のオープンは令和8年11月を予定しています。



調整池工の様子

請負業者	山藤・貴船・阿左美(仮称)西鹿田グリーンパーク公園整備工事 特定建設工事共同企業体
工期	変更前：令和8年3月31日 ➡ 変更後：令和8年8月31日

### 今後の予定

	西鹿田グリーンパーク整備	連絡協議会	公園づくり通信
令和4年度	基本計画 ・ 実施設計	<div>★ 第1回 (R4.5.24) 済</div> <div>★ 第2回 (R4.10.6) 済</div>	<div>★ 第1回 (R4.7) 済</div> <div>★ 第2回 (R4.10) 済</div> <div>★ 特別号1 (R4.12) 済</div>
令和5年度		<div>★ 第3回 (R5.5.29) 済</div> <div>★ 第4回 (R5.10.30) 済</div>	<div>★ 特別号2 (R5.4) 済</div> <div>★ 第3回 (R5.6) 済</div> <div>★ 第4回 (R5.11) 済</div>
令和6年度	盛土造成工事	<div>★ 第5回 (R6.10.24) 済</div>	<div>★ 第5回 (R6.12) 済</div>
令和7年度		<div>★ 第6回 (R7.10.31) 済</div>	<div>★ 第6回 (今回)</div>
令和8年度	公園施設工事	<div>★ 年2回を目安に開催する予定です。</div>	<div>★ 協議会開催後に発行します。</div>

※建築物工事は、公園整備工事の進捗状況を見ながら工期延長を検討。  
※事業の進行状況等により、スケジュールが変更となることがあります。
